


Constitution d'une collection mutualisée et recours au CTLes

5 avril 2022

Stéphanie Groudiev

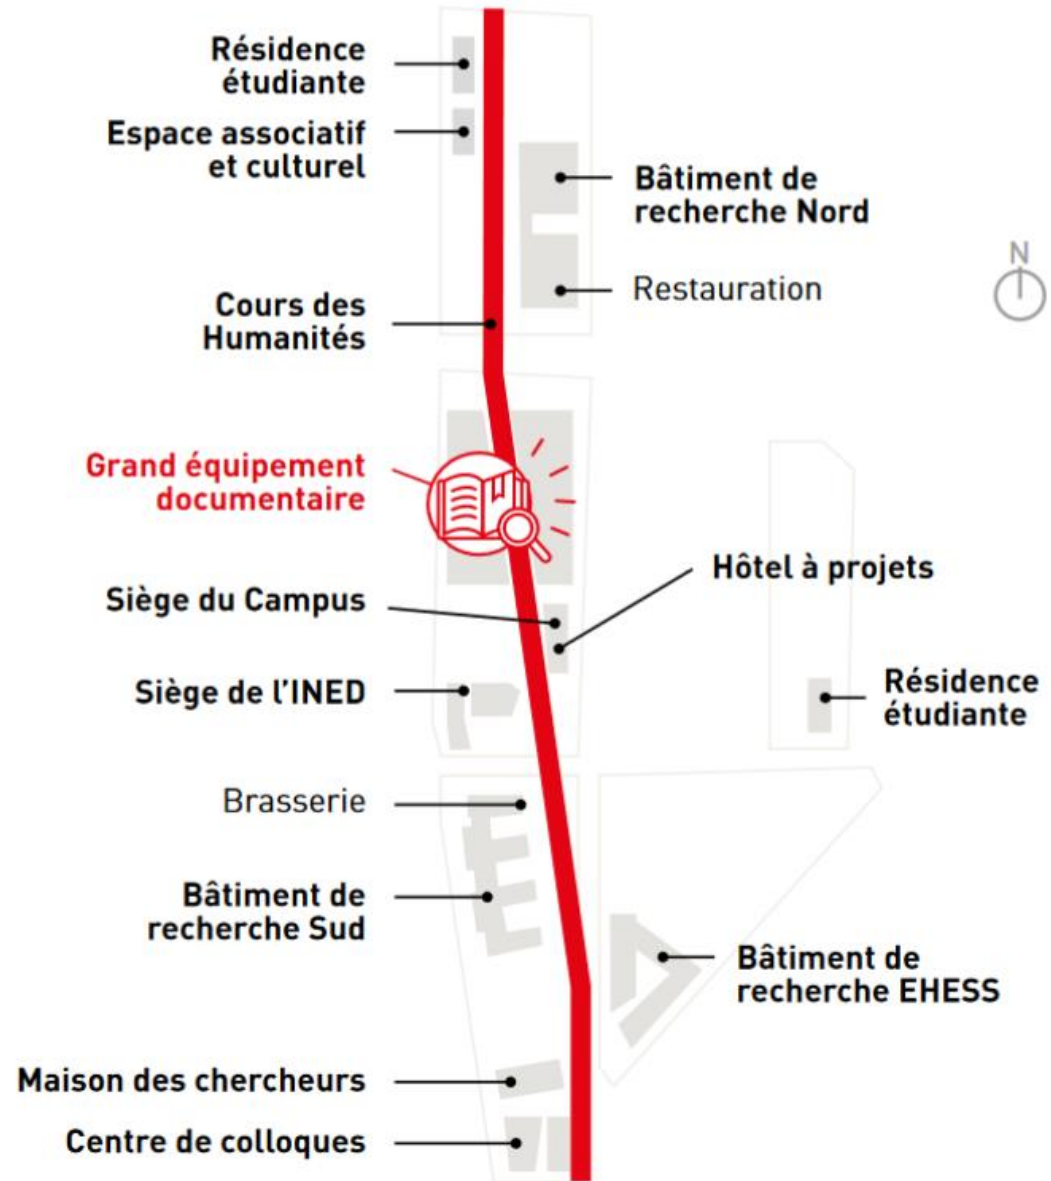

Le projet

Mutualiser

- 50 bibliothèques, centres de documentation et services d'archives
- répartis sur 25 sites en Île-de-France

Volumétrie

- environ 1 million de volumes, 34 km linéaires
- 5 km linéaires d'archives scientifiques

Des documents de tous types et sur tous supports

- des imprimés
- des documents manuscrits, des photographies, des enregistrements audiovisuels, des cartes, des objets
- des documents numériques

Conservation

- libre accès pour la majorité des documents : 1^{ers} exemplaires des monographies
- Réserve pour les archives et les documents rares
- CTLES pour les 2^{nds} exemplaires de monographies et les périodiques



Préparatifs

- Cartographie des collections et des archives
- Système d'information chantier :
 - Règles de dédoublonnage
 - Orientation
 - Implantation des collections et cotation virtuelle
 - Identification des surnuméraires
 - Métrages *estimatifs*

La vraie vie

- Août 2019 : premiers déménagements des équipes de recherche dans les bâtiments en PPP
- ~~Juin 2019 : mai 2020~~ : avril 2021 : livraison du bâtiment GED
- ~~Fin 2019 : fin 2020~~ : fin 2021 : ouverture des espaces du GED

⇒ Nécessité de mettre en place le GED hors les murs



Conséquences

- Trouver un espace de stockage qui permette d'assurer une continuité documentaire
- Anticiper sur la préparation des collections
- Programmer non pas un mais plusieurs déménagements

⇒ Une solution au manque de place dans les structures de départ



Le CTLes comme pivot


- Stockage provisoire : accueillir les collections pour la durée entre l'emménagement des équipes de recherche et la livraison du bâtiment GED
- Stockage dynamique : collections accessibles via une navette mise en place par le GED / grands formats sur palettes
- Chaînes de traitement : rééquiper, reclasser, dédoublonner
- Stockage tampon : seconds exemplaires et périodiques



En chiffres

- Septembre 2019 à janvier 2020 : 16 sites, 35 structures documentaires, 15 km linéaires déménagés
- Rééquipement : 45 000 documents rééquipés au CTLes
- Des chantiers réguliers : dédoublonnages des périodiques, identification des surnuméraires , préparation des transferts etc.






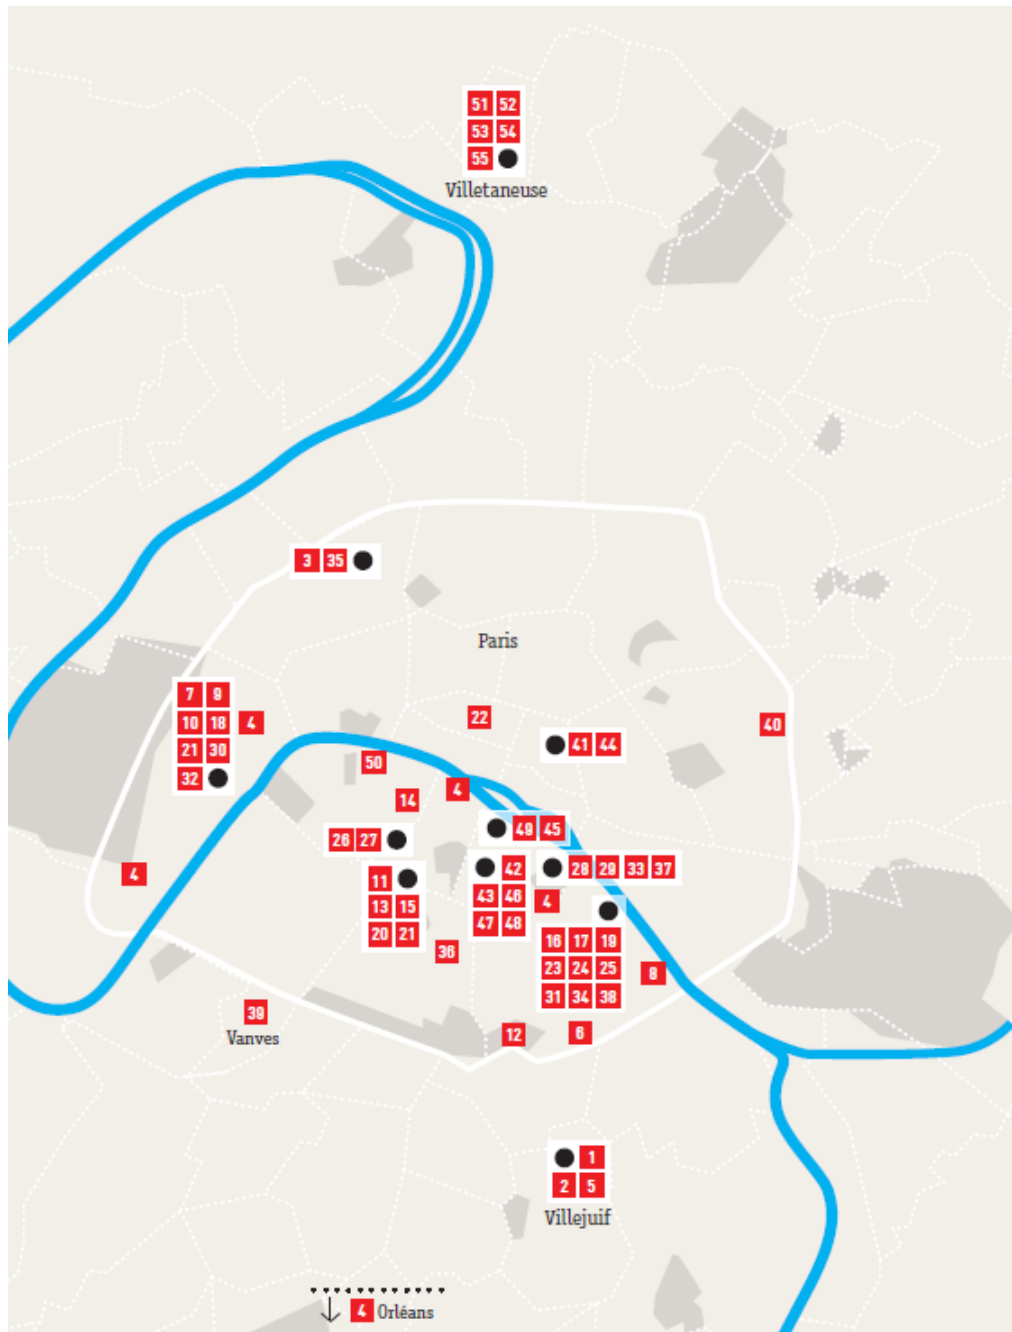

Annales

Histoire, Sciences Sociales
 Histoire et Droit
 Aux fondements juridiques des sociétés
 Justice et Libéralisme
 La corruption des juges
 Débats historiographiques
 Justice et répression



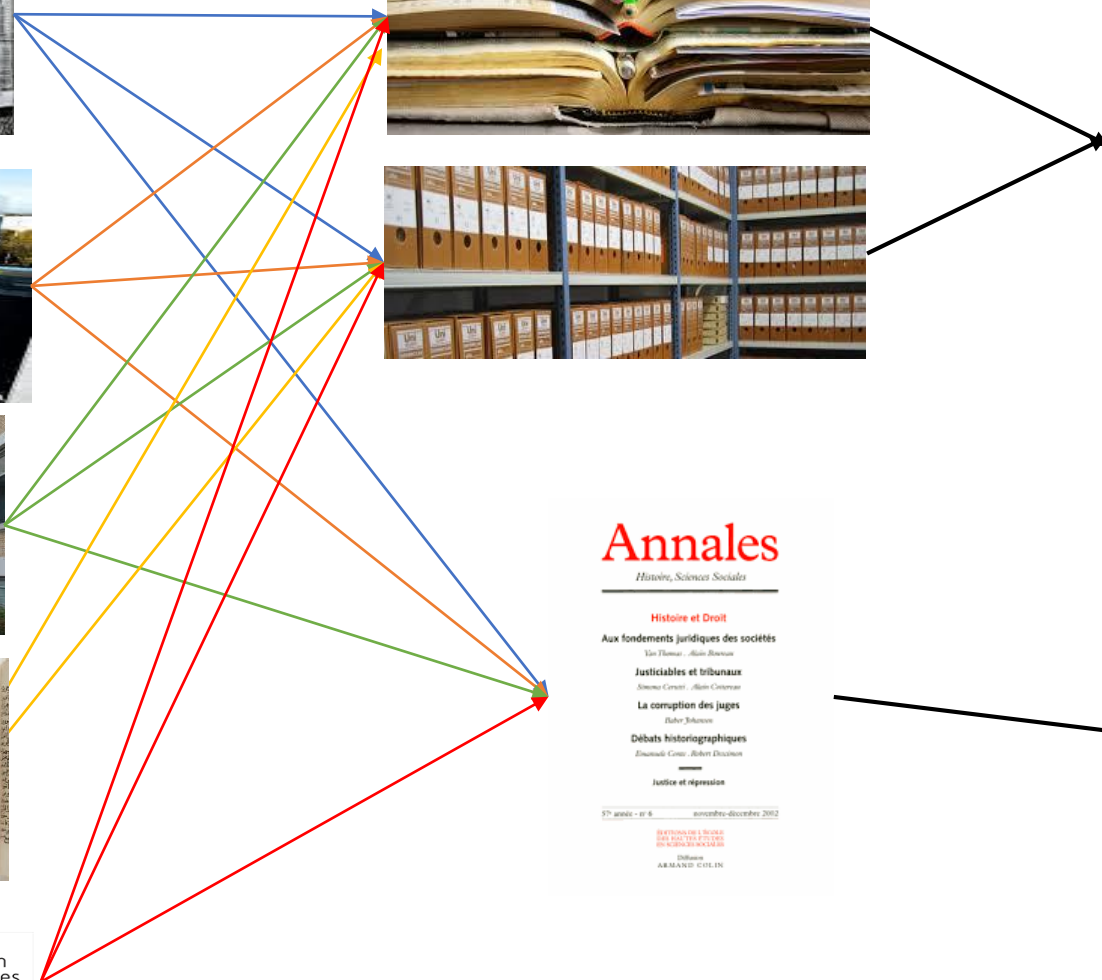

Annales

Histoire, Sciences Sociales

Histoire et Droit

Aux fondements juridiques des sociétés

Yves Thomas - Alain Breton

Justiciables et tribunaux

Suzanne Cosset - Alain Cottereau

La corruption des juges

Robert Schickel

Débats historiographiques

Étienne Côté - Robert Dussan

Justice et répression

57 ans - n° 6 novembre-décembre 2012

ÉDITIONS DES ÉCRITS
DES UNIVERSITÉS
DE LA MAISON DES SCIENCES
DE L'HOMME

Diffusion
ARMAND COLIN






Espace de stockage temporaire

Espace de traitement des collections

Espace de stockage tampon

Espace de stockage définitif

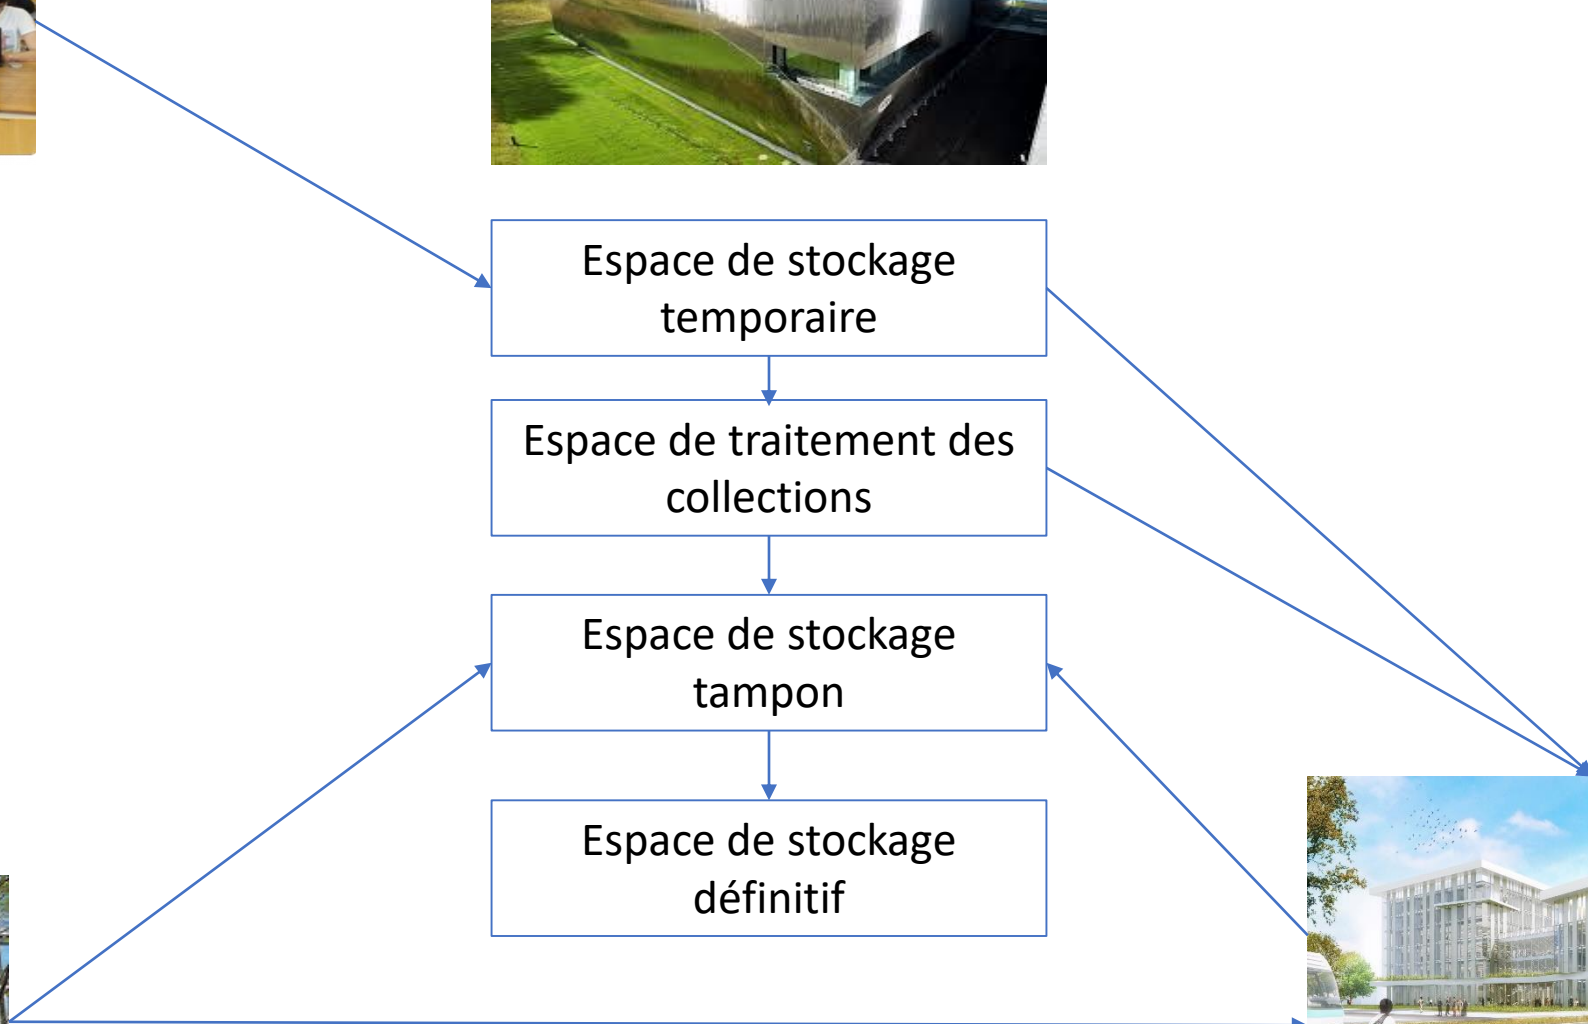

En chiffres, la suite

- 6 000 mètres de périodiques depuis 20 structures vers le CTLES
- 4 500 mètres d'archives depuis 27 structures vers le GED
- 16 000 mètres de monographies depuis 49 structures vers le GED

- Occupation du libre accès du GED fin 2021 : environ 450 000 documents
- Taux de remplissage des réserves du GED fin mai 2022 : 100%



La suite

Fin du déménagement 2 – phase 1 : déménagement des collections déjà accessibles aux chercheurs dans les structures documentaires d'origine : été 2022

Déménagement 2 – phase 2 :

- Déménagement des objets
- Déménagement des collections qui ne se trouvent pas actuellement dans les structures documentaires d'origine : à programmer

Inscription dans les transferts réguliers du CTLes pour les périodiques et les seconds exemplaires de monographies





